

13 februari 2023

Werken N49 - Stoepestraat Zelzate-Assenede:


periode medio februari 2023 – najaar 2023



Project Stoepestraat

Werken hoofdaanneming:

Fase 1:

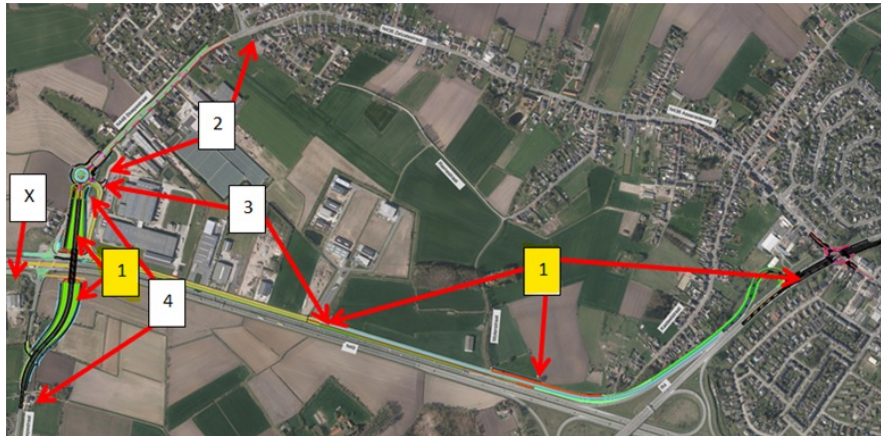


- Werken in functie van het verlengen van de bestaande fietstunnel onder de N49
 - **betonwerken gedaan 01/03/2023**
- Aanleg nieuwe wegenis parallel met de N49 met inbegrip van het nieuwe kruispunt op de R4
 - **toplagen asfalt wegenis en fietspad vanaf 15/03/2023**
 - **openstellen nieuw kruispunt met R4 week van 26/03/2023**
- Ophogen grondmassieven van de toekomstige brug
 - **afgerond**

Project Stoepestraat

Werken hoofdaanneming:


Fase 2:

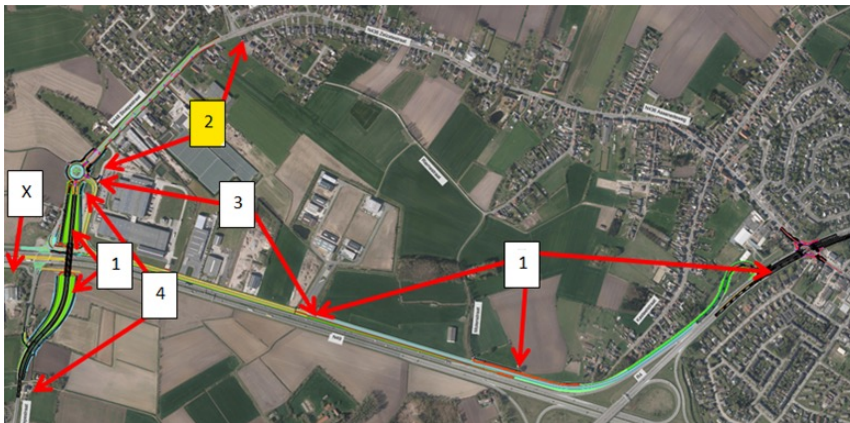

- Heraanleg van de bestaande Stoepestraat
 - toplaag asfalt wegenis: week van 26/03/2023
- Herinrichting kruispunt Trieststraat
 - aanleg tijdelijk asfaltweg week 13/02/2023
 - verkeer in beide richtingen met lichtenregeling (idem periode voor de kerstvakantie)
 - opbraak bestaande kruispunt vanaf 16/02/2023
 - toplaag asfalt wegenis eind week 26/03/2023

Project Stoepestraat

Verkeersafwikkeling periode 13/02/2023 –
27/03/2023:

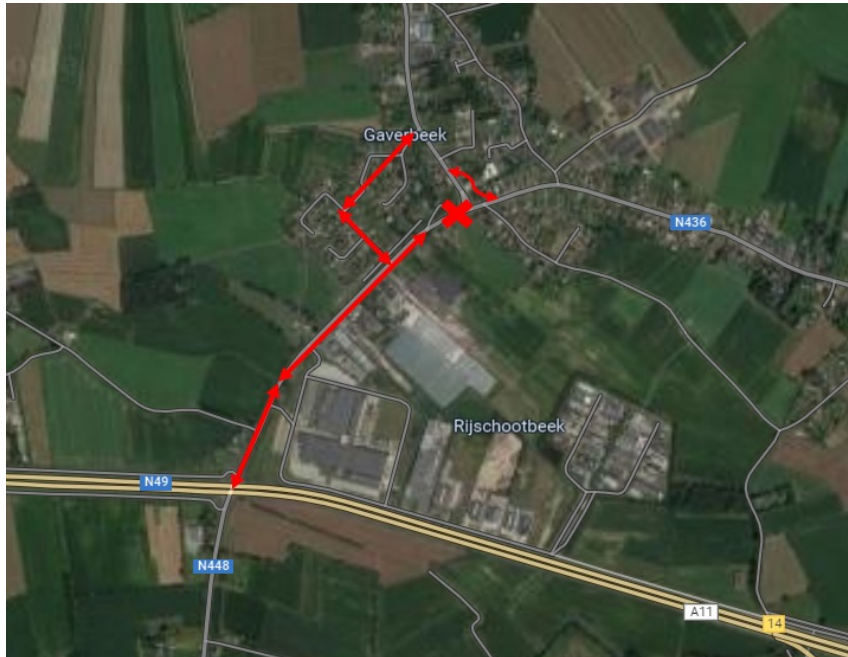

- Verkeer vanuit Triesstraat en De Katte naar Stoepestraat niet mogelijk
- Lokaal verkeer Stoepestraat via Speltreep naar Trieststraat of via werfzone naar kruispunt N49
- Kruispunt N49-Stoepestraat blijft open

Project Stoepestraat

Werken hoofdaanneming:

Fase 3a:




- Heraanleg van Paul Christiaensstraat / Heideveld vanaf parking ADIENT richting R4
- onderlagern asfalt 16 en 17/02/2023
- toplagen wegenis en fietspad vanaf 15/03/2023
- openstellen nieuw kruispunt met R4 vrijdag 24/03/2023

Project Stoepestraat

Werken hoofdaanneming:

Fase 3b:

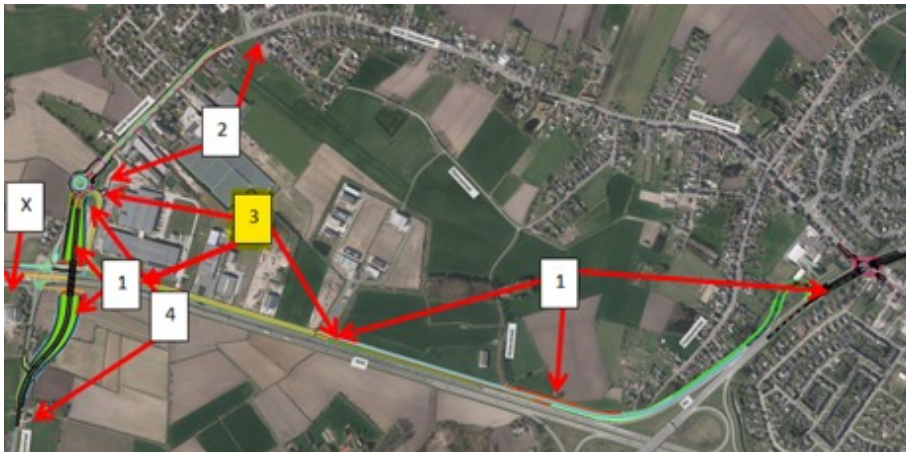

- Aanleg deel Paul Christiaensstraat (beton) tussen rotonde en parking ADIENT
 - start week 27/03/2023
 - einde 2^{de} helft juni 2023
- Bouw nieuwe rotonde inclusief vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en aanleg van een gescheiden riolering.
 - start week 27/03/2023
 - einde 2^{de} helft juni 2023

Project Stoepestraat


Verkeersafwikkeling periode 27/03/2023 –
30/06/2023:



- Kruispunt Stoepestraat – N49 definitief dicht
 - 27/03/2023
- Stoepestraat bereikbaar vanaf kruispunt met Trieststraat (doodlopend tot aan werken)
- Bedrijven langs Paul Christiaenstraat bereikbaar via nieuwe aansluiting op R4.

Project Stoepestraat

Verkeersafwikkeling landbouwverkeer periode 27/03/2023 – 30/06/2023:

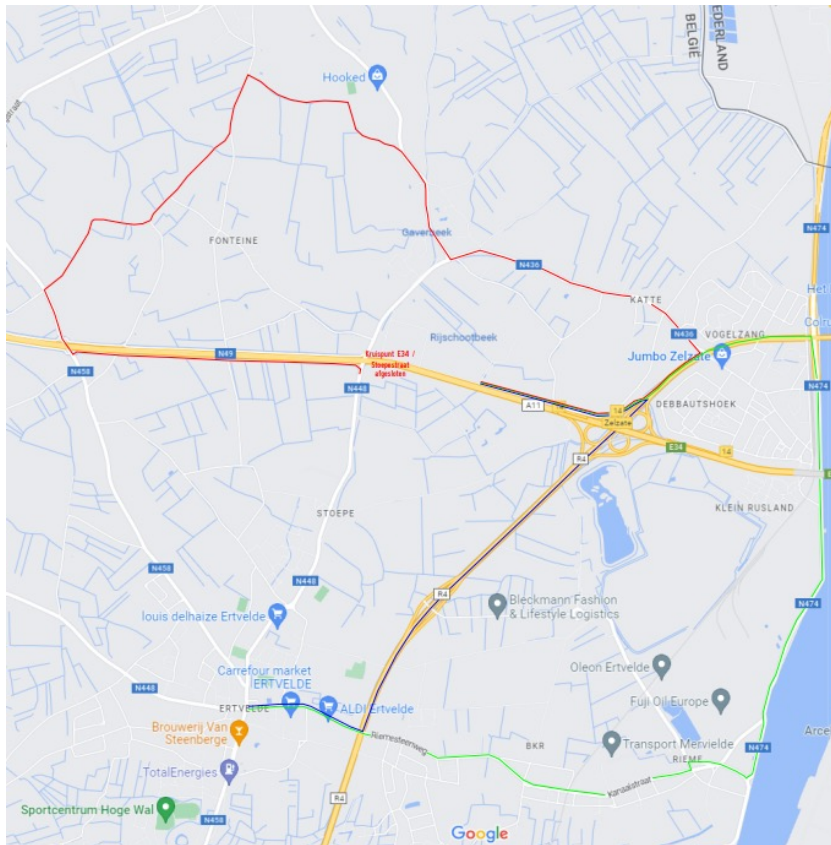

- 27/03/2023: kruispunt Stoepestraat – N49 definitief dicht
- Landbouwverkeer van overzijde N49 (kant Ertvelde): via rode en groene omleiding

Project Stoepestraat

Verkeersafwikkeling periode 30/06/2023 tot einde werken (eind oktober/begin november):




- Kruispunt Stoepestraat – N49 definitief dicht
- Tijdelijke verbinding tussen Meelstraat en rotonde (te onderzoeken)
- Stoepestraat bereikbaar vanaf kruispunt met Trieststraat en via rotonde
- Bedrijven langs Paul Christiaenstraat bereikbaar via nieuwe aansluiting op R4 en via rotonde.

Project Stoepestraat

Werken hoofdaanneming:

Fase 4:

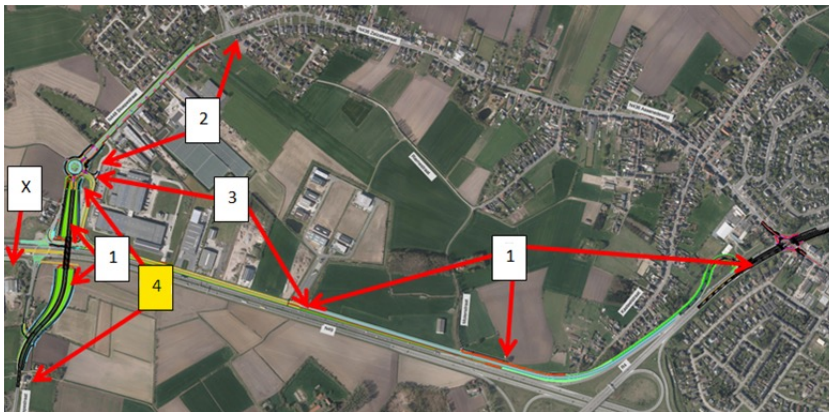

- Bouw van de brug over de N49
 - liggers: eind maart 2023
 - tussenbalken: begin april tot eind juni 2023
 - brugdek: begin juni tot half augustus 2023
- Aanleg van de wegenis op de aanloophellingen naar de brug en op de brug
 - september-oktober 2023
- Afwerking op E34
 - oktober 2023
- Volledige openstelling
 - eind oktober – begin november 2023

Project Stoepestraat

Verkeersafwikkeling periode 27/03/2023 – eind oktober/begin november 2023 op E34:

- Kruispunt Stoepestraat – N49 definitief dicht
- Doorgaand verkeer op de E34 steeds mogelijk:
 - met versmalde rijstroken
 - met wissels doorheen de middenberm
 - met verlaagd snelheidsregime 50km/h
- Weinig tot geen invloed op lokaal verkeer bedrijvzone
